

COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA VITTORIO EMANUELE II

Codice generale	Codice dell' opera	Lotto	Livello di progettazione	Area di progettazione	Numero elaborato	Tipo documento	Versione
Abri	026	0	D	G	009	crono	0-19

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

Geom. Romina BRUNO FRANCO

I PROGETTISTI:

Dott. Ing. Valter Ripamonti (Capogruppo)



Dott. Ing. Ivan Barbero

Dott. Geol. Marco Barbero

Studio Tecnico Dott. Ing. Valter Ripamonti - Via Tessore n° 25 - 10064 Pinerolo - (TO)

Tel 0121/77445 - Fax 0121/375733 - E-Mail:segreteria@ripamontistudio.com - tecnico@ripamontistudio.com


PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

VERS.	MODIFICHE	DATA	REDATTORE	SCALA
0	PRIMA CONSEGNA	04 Febbraio 2019	AR	
1				
2				
3				
4				

COMUNE DI BRICHESASIO
Città Metropolitana di Torino
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA VITTORIO EMANUELE II
- PROGETTO DEFINITIVO -

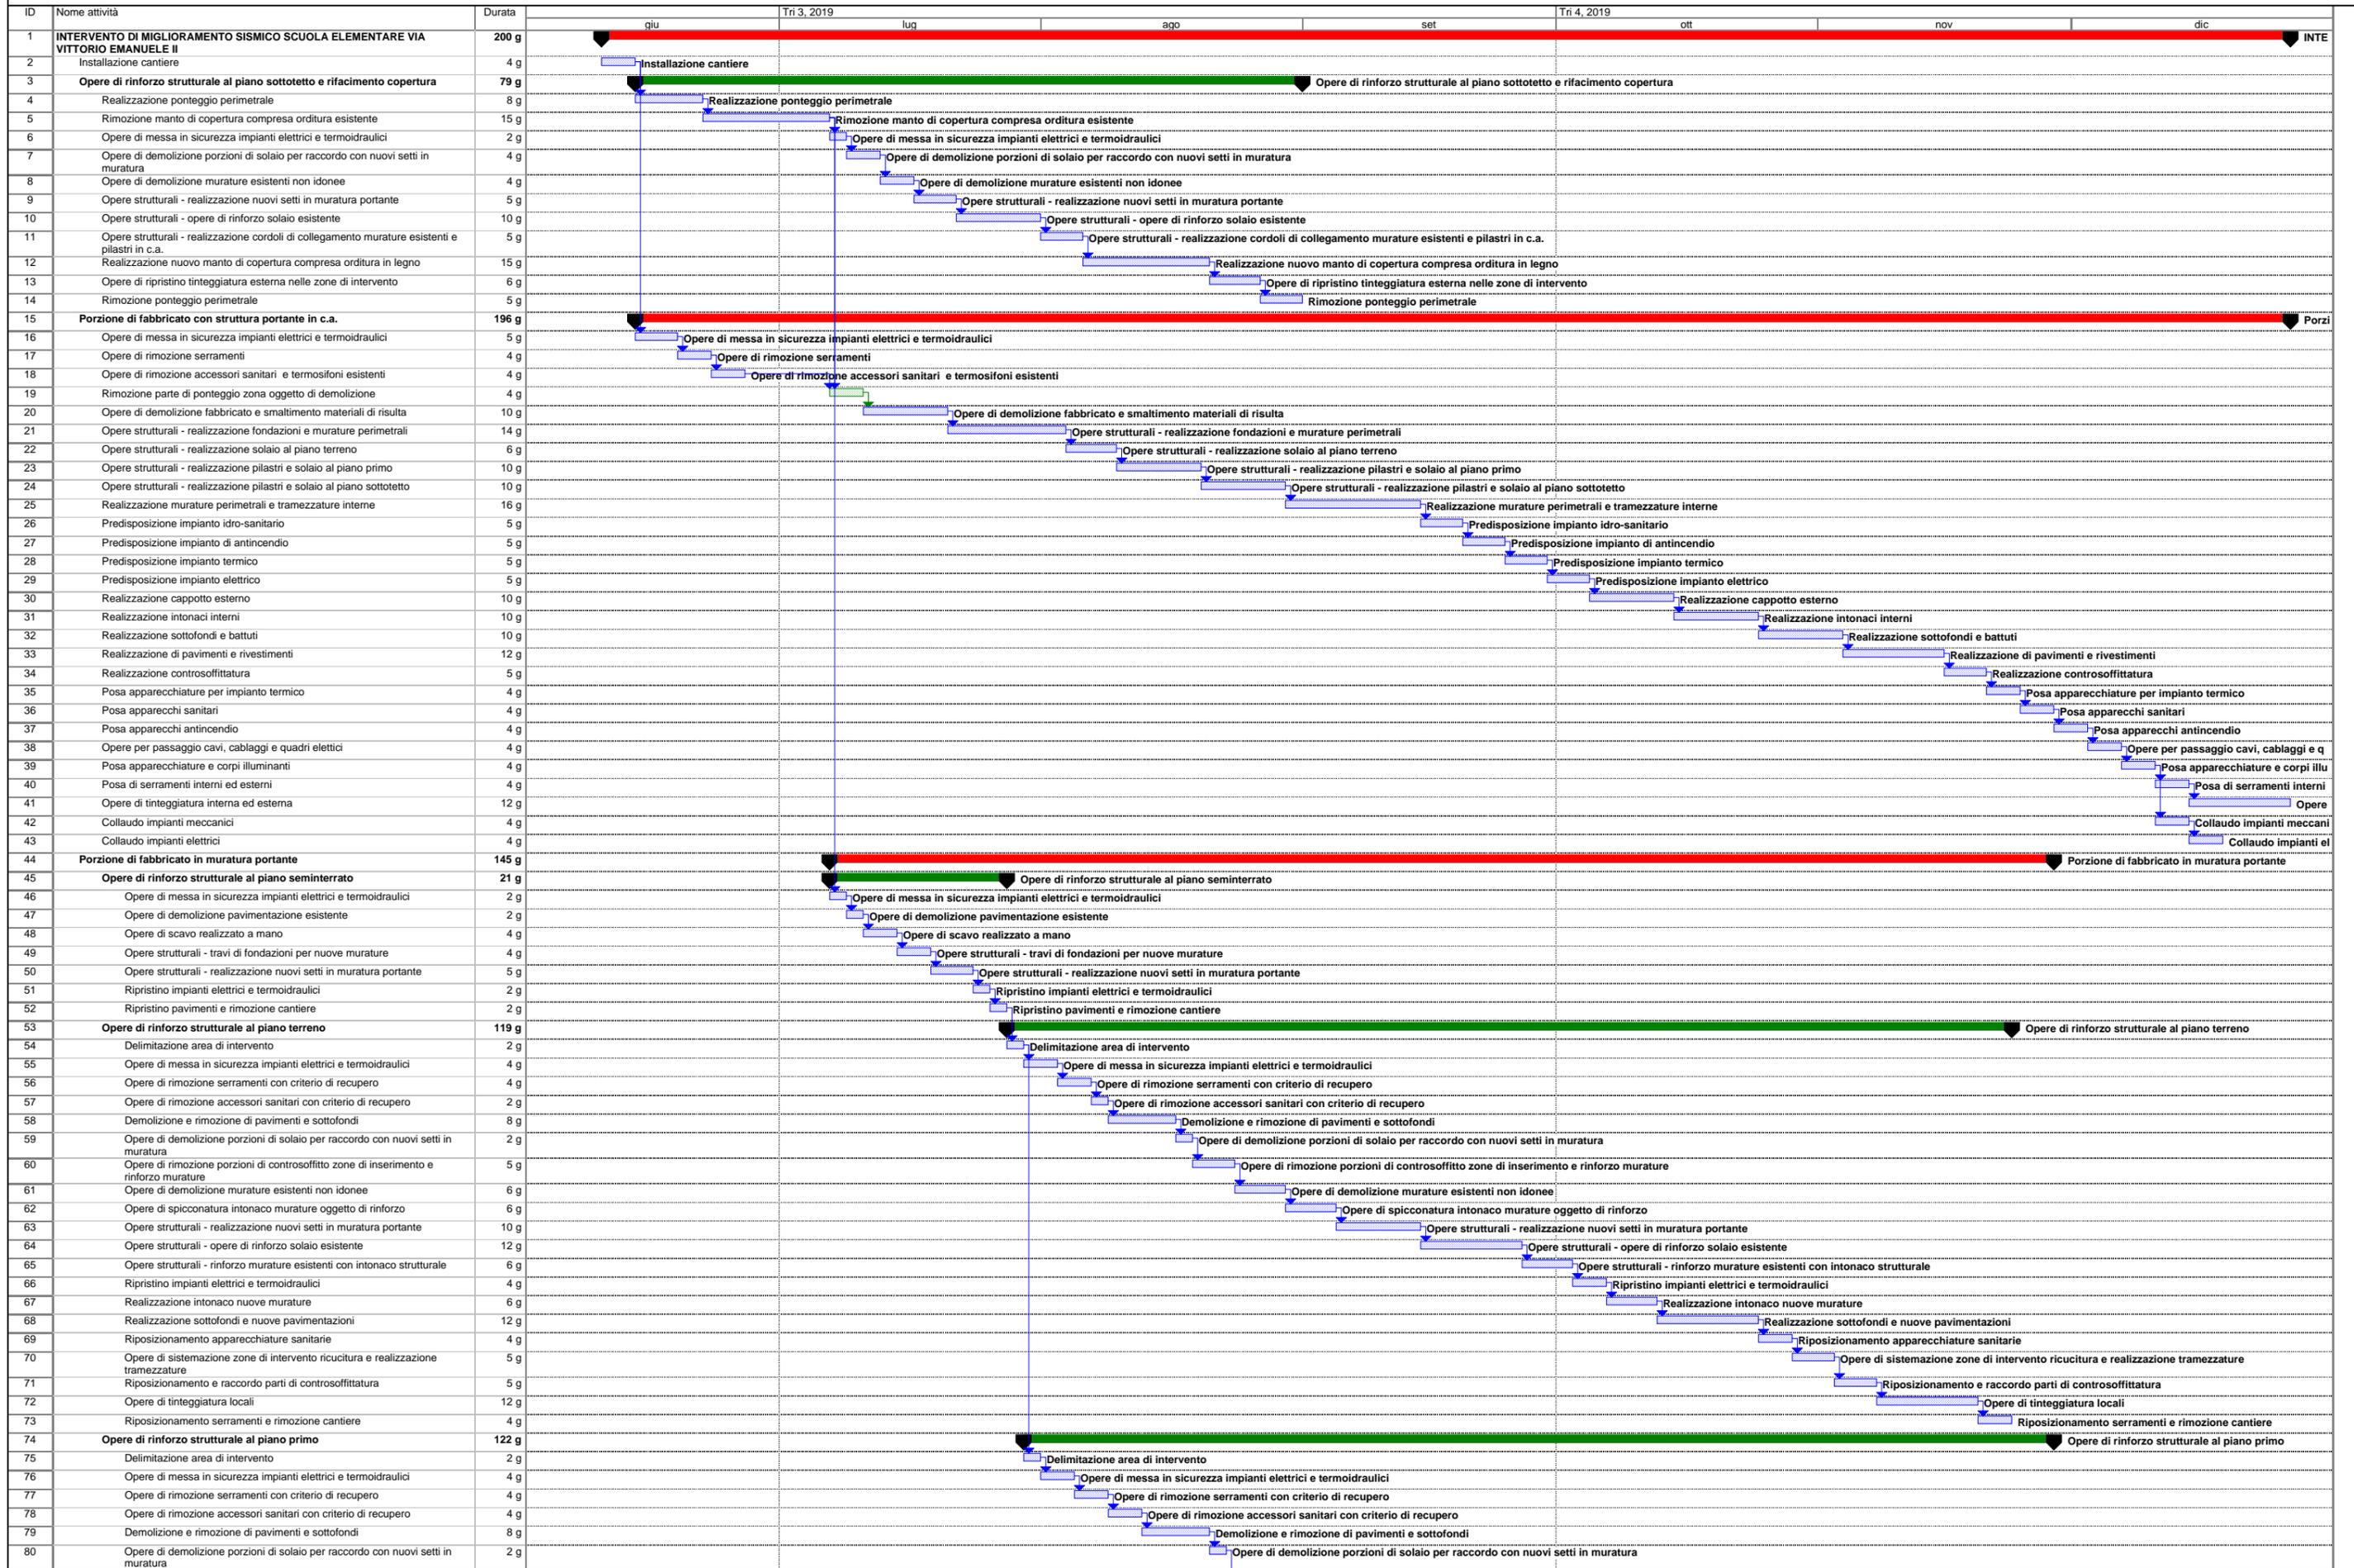

COMUNE DI BRICHESASIO
Città Metropolitana di Torino
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA VITTORIO EMANUELE II
- PROGETTO DEFINITIVO -

ID	Nome attività	Durata	Tri 3, 2019					Tri 4, 2019					
			giu	lug	ago	set	ott	nov	dic				
81	Opere di rimozione porzioni di controsoffitto zone di inserimento e rinforzo murature	5 g											
82	Opere di demolizione murature esistenti non idonee	4 g											
83	Opere di spicconatura intonaco murature oggetto di rinforzo	6 g											
84	Opere strutturali - realizzazione nuovi setti in muratura portante	10 g											
85	Opere strutturali - opere di rinforzo solaio esistente	12 g											
86	Opere strutturali - rinforzo murature esistenti con intonaco strutturale	6 g											
87	Ripristino impianti elettrici e termoidraulici	6 g											
88	Realizzazione intonaco nuove murature	6 g											
89	Realizzazione sottofondi e nuove pavimentazioni	12 g											
90	Riposizionamento apparecchiature sanitarie	4 g											
91	Opere di sistemazione zone di intervento ricucitura e realizzazione tramezzature	5 g											
92	Riposizionamento e raccordo parti di controsoffittatura	5 g											
93	Opere di tinteggiatura locali	12 g											
94	Riposizionamento serramenti e rimozione cantiere	5 g											
